
GRUPO C

Academia RD - Reto 9

Documento de Planificación del Proyecto

Hito 1: Metodología Ágil

Erika Graciela Paulino 100666248

Jorge Agdiel Salcedo Alvarez 100676931

Elaine Jacqueline Binet Gonzalez 100533316

Josué Ismael Rosario Aquino 100671503

Jaycob Ricardo Gómez Ortiz 100529648

Wander Perez Piña DC4108

Link en GitHub

<https://github.com/ErikaPaulino/AcademiaRD>

Link del repositorio para clonar

<https://github.com/ErikaPaulino/AcademiaRD.git>

Link en Netlify

<https://colegiomolaco.netlify.app/>

Link de Drive con la organización grupal

https://drive.google.com/drive/folders/1ECPCS7RlwJ4ZZrmOO9Wgi-L3v2ynGiqD?usp=drive_link

A. Acta de Inicio del Proyecto (Project Charter)

1. Problema específico que resuelve la aplicación

Nuestra aplicación resuelve la problemática de un descontrol administrativo de un colegio de aproximadamente 60 estudiantes, automatizando el registro de asistencia, pagos mensuales y el monitoreo de estudiantes activos. También cuenta con un área de pendientes por hacer.

2. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que automatice la gestión administrativa del Colegio Educativo Molaco, centralizando el control de asistencia diaria y el seguimiento de pagos mensuales.

3. Objetivos Específicos

- Implementar un módulo de control de asistencia que registre y consulte la asistencia diaria de los estudiantes de forma automatizada, con alertas visuales para ausencias frecuentes.
- Desarrollar un módulo de gestión de pagos que permita registrar cobros mensuales, identificar deudas pendientes y reflejar el estado de pago (pagado, parcial, pendiente) en tiempo real.
- Crear un dashboard de resumen que muestre métricas clave del negocio: total de estudiantes activos, pagos pendientes del mes e ingresos estimados.

4. Usuarios de la aplicación

Usuario primario:

Nombre: Ingrid (propietaria y directora de la academia)

Perfil técnico: Conocimientos muy básicos de informática.

Uso principal: Gestionar pagos mensuales y consultar el dashboard.

Usuario Secundario

Perfil: Personal docente o encargados autorizados, con conocimientos muy básicos en informática.

Uso principal: Registros de asistencia, administrar estudiantes y área de pendientes.

5. Fuera del Alcance

- Sistema de mensajería con padres de familia, requiere integración de servicios de notificación (SMS/email) que excede la duración del período de 3 semanas.
- Áreas divididas de docentes y directora. Por falta de tiempo no se pudo implementar.
- Hacer la página web de la escuela. Por falta de tiempo.

6. Integrantes y Roles

Nombre Completo	Matrícula	Rol en el Proyecto
-----------------	-----------	--------------------

Erika Graciela Paulino	100666248	Coordinadora, desarrolladora de base de datos y módulo de pendientes.
Jorge Agdiel Salcedo Alvarez	100676931	Módulo de asistencia y sistema de navegación
Elaine Jacqueline Binet Gonzalez	100533316	Módulo de estudiantes y módulo de cursos.
Josué Ismael Rosario Aquino	100671503	Módulo de pagos
Jaycob Ricardo Gomez Ortiz	100529648	Dashboard, diseño y apoyo en la planificación
Wander Pérez Piña	DC4108	Login/autenticación, apoyo en interfaz web y creación de usuarios

7. Negocio Real Seleccionado

Nombre	Colegio Educativo Molaco
Sector	La Zurza
Ubicación	Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana
Descripción	Centro educativo privado que ofrece clases regulares a estudiantes de primaria y secundaria, organizados por grados y horarios establecidos. Atiende aproximadamente 80 estudiantes activos.
Contacto Validación	/ Observación directa del flujo de trabajo administrativo e interacción con la administradora (Ingrid), quien describió el proceso manual de registro de asistencia y cobros, sirviendo como base para los requisitos funcionales de la aplicación.

B. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

Nivel 1 — Proyecto Completo

Sistema de Gestión para Colegio Educativo Molaco (AcademiaRD)

Nivel 2 — Fases

Configuración	Levantamiento	Diseño de base de datos	Desarrollo de base de datos	Módulo de pendientes	Módulo Estudiantes	Módulo Asistencia	Módulo Pagos	Dashboard + Despliegue
----------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------

Nivel 3 — Tareas Concretas

Fase	Tareas
Fase 1 Configuración	Crear repositorio en GitHub · Crear carpeta compartida en Google Drive · Inicializar proyecto con Vite + React
Fase 2 Levantamiento	Visita y observación del negocio (Colegio Molaco) · Entrevista con la administradora Ingrid · Documentar flujo de trabajo actual · Reunión presencial #1 del equipo · Fotografiar evidencia de visita
Fase 3 Diseño de base de datos	Se diseñó la base de datos, definiendo relaciones y identidades con sus atributos
Fase 4 Desarrollo de base de datos	Se creó la base de datos en supabase.
Fase 5 Módulo Estudiantes	Diseño del formulario de registro · Implementar CRUD de estudiantes en supabase · Validación de formularios con mensajes de error · Pruebas del módulo
Fase 6 Módulo Asistencia	Diseño del listado diario de asistencia · Implementar registro de asistencia por grupo · Pruebas del módulo
Fase 7 Módulo Pagos	Diseño del formulario de pago · Implementar registro de cobros con estado (pagado/parcial/pendiente) · Filtro de deudores del mes · Pruebas del módulo
Fase 8 Dashboard	Diseño de tarjetas de métricas · Implementar totales: estudiantes activos, pagos pendientes, ingresos estimados · Integración de todos los módulos · Pruebas de integración
Fase 9 Despliegue y Docs	Revisión final y correcciones · Despliegue en Netlify con acceso público.

C. Cronograma — Diagrama de Gantt (3 semanas)

Período: 19 de abril – 9 de mayo de 2025 · Duración total: 21 días

Cronograma — Diagrama de Gantt (3 semanas)

CRONOGRAMA DE PROYECTO

19 de Abril – 9 de Mayo, 2025

CATEGORÍAS

Infraestructura a Colaboración / Base de Datos de Reuniones		Desarrollo	Entrega Final
19 Abr		[Infraestructura] 19 de abril Creación del repositorio en GitHub	
20 Abr		[Investigación] 20 de abril Búsqueda y selección de colegios	
22 Abr		[Base de Datos] 22 de abril Inicio de la planificación de la base de datos	
24 Abr		[Colaboración] 24 de abril Creación de carpeta en Drive para acceso compartido a documentos	
25 Abr		[Reunión] 25 de abril Primera reunión virtual: planificación de encuentros y asignación de roles	
27 Abr		[Reunión] 27 de abril Primera reunión presencial: planificación del sistema, discusión de métodos, diseño visual y revisión de BD	
29 Abr		[Base de Datos] 29 de abril Finalización del desarrollo de la base de datos	
1 May		[Desarrollo] 1 de mayo Creación del módulo de Login del proyecto	
2 May		[Revisión] 2 de mayo	

Muestra del avance de desarrollo al profesor

4 May

[Reunión] 7 de mayo
Segunda reunión presencial

9 May

[Entrega] 9 de mayo
Entrega final del proyecto

D. Registro de riesgos.

Se identifican los siguientes riesgos con probabilidad de ocurrencia significativa durante el período de desarrollo (19 abril – 9 mayo, 2025):

ID	Categoría	Descripción del Riesgo	Prob.	Impacto	Plan de Mitigación	Responsable
01	Técnico	Inconveniente con el acceso a la base de datos	Media	Alto	Tuve que tumbar las normas de acceso de la base de datos, para que los compañeros pudieran usarla.	Erika Paulino
02	Técnico	Conectar el área de asistencia a la base de datos.	Media	Alto	Me puse en comunicación con la encargada de la base de datos.	Jorge Salcedo
03	Equipos	Tuvimos un problema de versiones en el repositorio.	Media	Alto	Nos pusimos de acuerdo para avisar cuando hacíamos push	Coordinadora
04	Alcance	Se subió una versión errónea al repositorio y borró lo que ya teníamos hecho.	Alta	Alto	Subimos la última versión buena que teníamos, después de buscar por 2 horas completas.	Todo el equipo
05	Negocio	Fuimos a 5 colegios y nos exigen una carta hecha por el profesor y	Baja	Medio	Tuvimos que inventar el colegio.	Todo el equipo

		evidencia de que somos estudiantes de la UASD.				
06	Técnico	Hubo un problema con el login, exactamente el registro de los nuevos usuarios; hubo discrepancias a la hora de la aplicación conectarse a la base de datos y crear los usuarios nuevos.	Alta	Alto	Se tuvo que cambiar la lógica de la base de datos para que pueda crear los usuarios nuevos. Se duró 8 horas solucionando este inconveniente.	Erika Paulino y Wander Pérez
07	Técnico	Manejando los modales y las operaciones CRUD.	Media	Medio	Lo solucioné validando cada función por separado, revisando errores y también reduje código repetido usando funciones reutilizables.	Elaine Binet.
08	Técnico	La Base de Datos se ponía lenta en las noches, evitando que avanzamos en el proyecto de manera adecuada.	Media	Alto	Se solucionó trabajando el máximo tiempo posible de día.	Todo el equipo.
09	Terceros.	Varios compañeros comentaron el hecho de que su luz se cortaba constantemente. Algunos de ellos incluso sufrieron averías técnicas en sus equipos, disminuyendo el progreso del trabajo. Lo que hizo que no se pudiera trabajar en la base de datos por dos días completos debido a la incapacidad de actualizar la lógica de la misma.	Alta	Alto	La laptop de la compañera Ericka Paulino se arregló, pero la luz en los hogares de dos compañeros siguió mostrando irregularidades frecuentes.	Todo el equipo.
10	Técnico/Seguridad	Se reporta el hecho de que muchas bases de datos fueron atacadas masivamente y que eso	Alta	Alto	Se soluciona recurriendo al soporte técnico de la página que	Todo el equipo.

		afectó el desempeño de nuestra base de datos, que también fue una víctima			alojaba nuestra base de datos, pero se seguían reportando ataques.	
--	--	---	--	--	--	--

Documentación de evidencia (fotos/videos)


Primera reunión presencial.



Segunda reunión presencial. (07-05-2026)



Primera reunión virtual (25-04-2026)

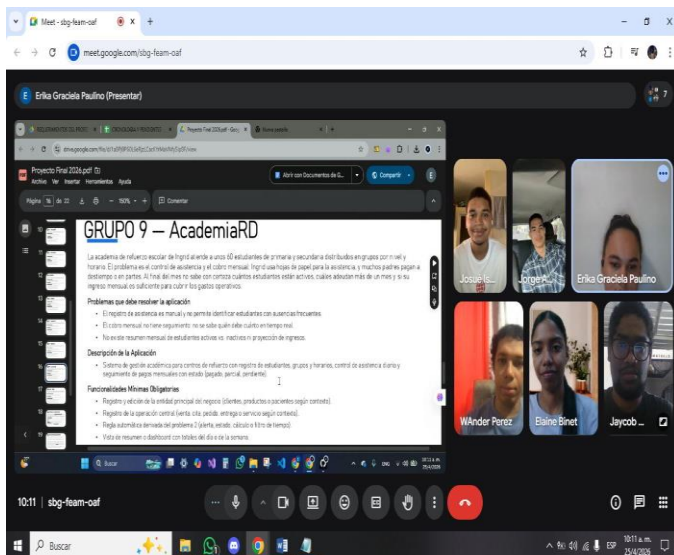

Segunda reunión virtual (8-5-2026)





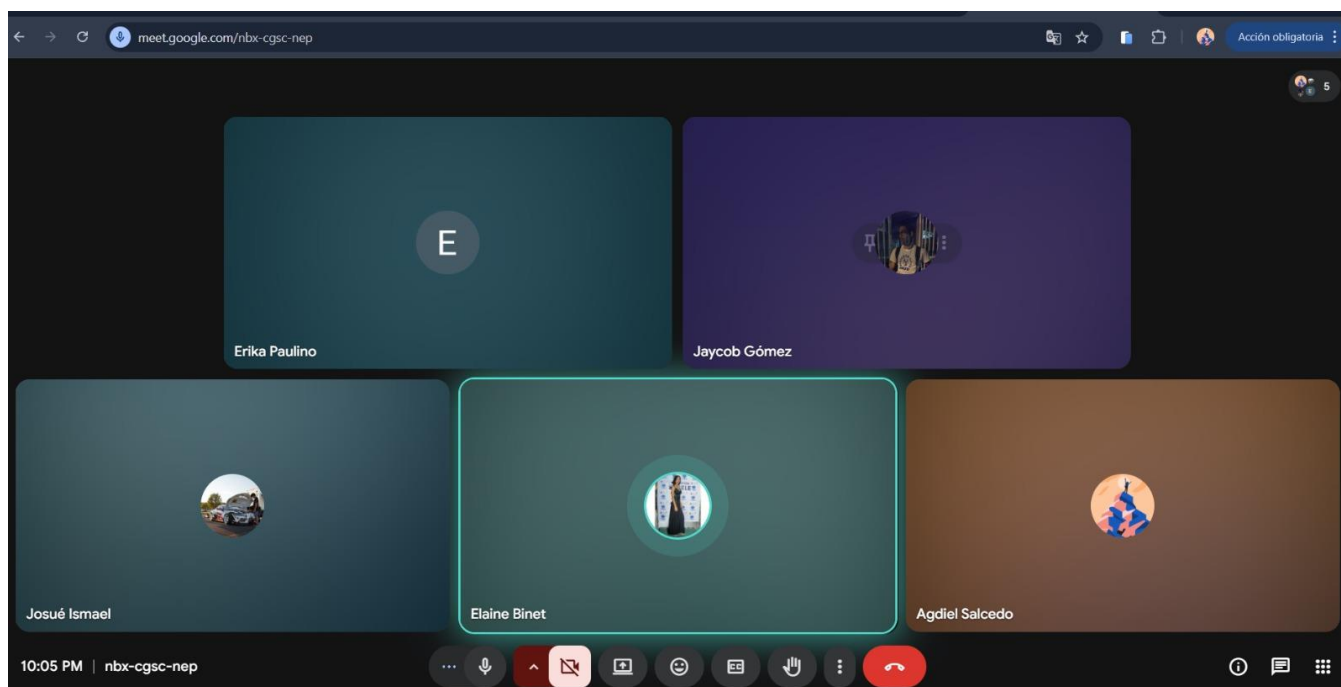


Foto de la planificación de base de datos.

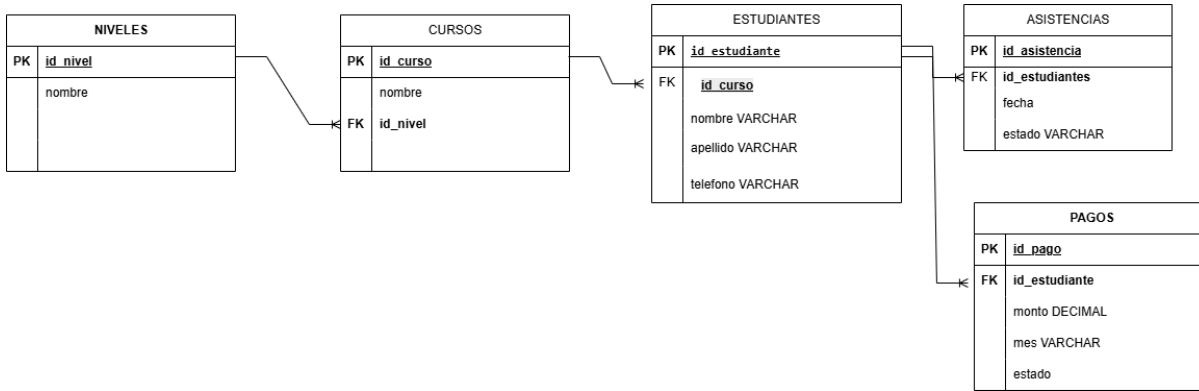

Base de datos hecha.

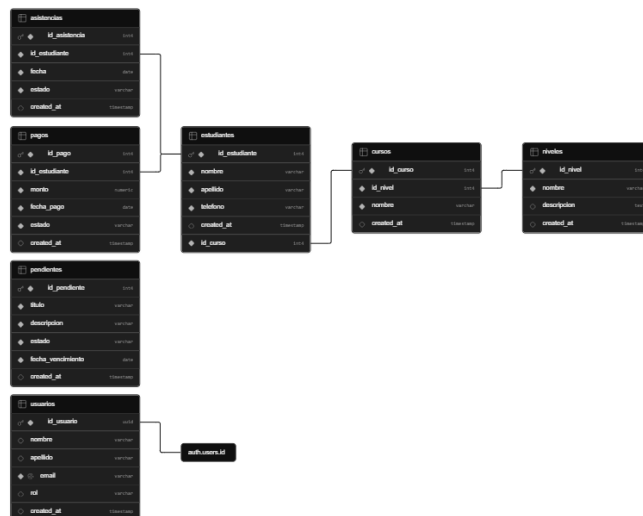

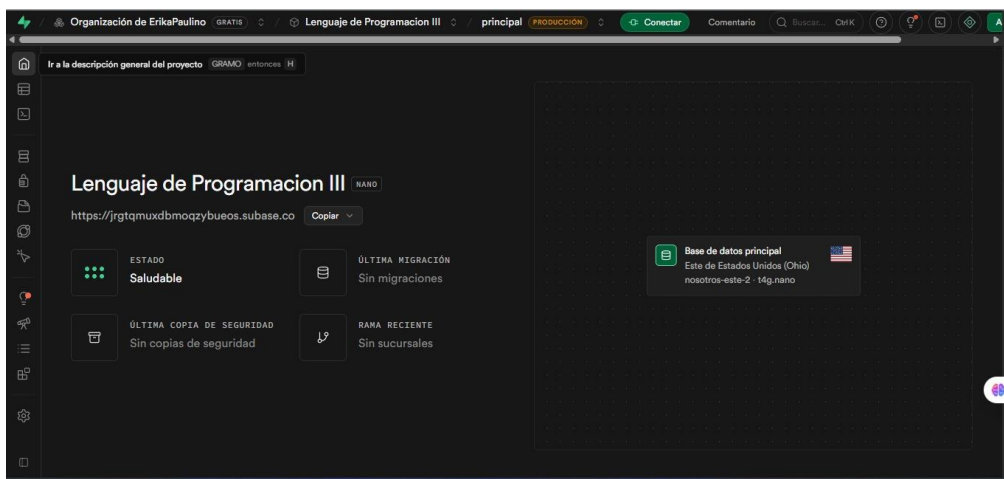

We've updated our Terms of Service. Learn more.

ErikaPaulino's Org FREE Lenguaje de Programacion III main PRODUCTION Connect

Feedback Search... Ctrl K

Database

schema public

Search for a table

+ New table

NAME	COLUMNS	ROWS (ESTIMATED)	SIZE (ESTIMATED)	REALTIME
asistencias	5	62	24 kB	Disabled
curtidos	4	2	24 kB	Disabled
estudiantes	6	7	24 kB	Disabled
niveles	4	2	32 kB	Disabled
pagos	6	14	24 kB	Disabled
pendientes	6	5	32 kB	Disabled
usuarios	6	3	40 kB	Disabled

7 tables

meet.google.com

Drive donde trabajamos los documentos teóricos de forma grupal.

Mi unidad > EXAMEN FINAL - PLANI...							
Tipo	Personas	Modificado	Fuente				
Nombre	Propietario	Fecha de modificación	Tamaño del i	Ordenar			
1- PLANIFICACION	E yo	24 abr yo	—				
2- DISEÑO	elainebinet06	25 abr	—				
3- BORRADORES	E yo	24 abr yo	—				
4- DOCUMENTACION OFICIAL	josueismaelrosarioquin...	25 abr	—				
5- PRUEBAS DE REUNION Y MAS	E yo	25 abr yo	—				
6- BASE DE DATOS	E yo	27 abr yo	—				
FUNCIONALIDADES	natisanchez1997@gmail...	25 abr	—				
INVESTIGACION DEL PROYECTO Y DUDAS	E yo	24 abr yo	—				
REQUERIMIENTOS DEL PROFESOR	E yo	24 abr yo	—				
SUGERENCIAS PARA EL PROYECTO	escritos1311@gmail.com	25 abr	—				
CRONOLOGIA Y PENDIENTES	E yo	25 abr yo	2 KB				
Git_Guia_Referencia_v4.pdf	E yo	25 abr yo	21 KB				
INTEGRANTES	E yo	24 abr	1 KB				
Proyecto Final 2026.pdf	E yo	19 abr yo	427 KB				

Foto del repositorio de GitHub

The screenshot shows a web browser displaying the GitHub repository page for 'AcademiaRD' by user 'ErikaPaulino'. The repository is public and has 47 commits. The file explorer shows a directory structure with 'public' and 'src' folders, and several files including '.gitignore', 'README.md', 'eslint.config.js', 'index.html', 'package-lock.json', 'package.json', and 'vite.config.js'. The 'About' section on the right provides details about the repository, including its description 'Examen final de lenguaje de Programacion III', a README link, activity status, and release information. The repository has 0 stars, 0 forks, and 0 watchers. The bottom of the page shows a Windows taskbar with various application icons and the system clock indicating 10:18 p. m. on 8/5/2026.
